

Презентация проекта

Оптимизация процесса
сдачи ГТО на базе МБУ
СШ «Виктория»

Паспорт проекта

Оптимизация процесса сдачи ГТО на базе МБУ СШ «Виктория»

Общие данные:

Заказчик: Никитенко И.И. –начальник отдела ФК и С администрации МО Староминский район

Процесс: сдача норм ГТО

Границы процесса: с момента принятия решения о сдаче нормативов сотрудниками и родителями (законными представителями) воспитанников до вручения значков

Руководитель проекта: руководитель школы Порфинова Л.А.

Команда проекта: ФИО сотрудников

Обоснование:

1. Длительный процесс сбора желающих принимать участие в сдаче ГТО.
2. Длительный процесс прохождения сдачи нормативов.
3. Низкий процент охвата.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель
1.Увеличение целевой аудитории	50%	90%
2.Сокращение времени по подготовке и сдаче нормативов ГТО	8-9 мес.	4-5 мес.


Сроки:

- 1.Разработка и согласование проекта с заказчиком проекта- с 21.11.2022 г. по 5.12.2022 г.
- 2.Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса- с 5.12.2022 г. по 12.01.2023г.
- 3.Выявление проблем, формирование предложений по их решению – 16.01.2023 г. по 30.01.2023г.
- 4.Защита плана действий - 31.01.2023 г. по 07.02.2023г.
5. Реализация плана действий – с 08.02.2023г. по .22.03.2023 г.
- 6.Анализ и исправление ошибок- с 23.03.2023г. по 06.04.2023г.
- 7.Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта- с 10.04.2023г. по 24.04.2023г.
- 8.Мониторинг результатов- с 25.04.2023г. по 23.05.2023г.


Эффекты:

- Сокращение временных затрат подготовки и сдачи нормативов с 8-9 месяцев до 4-5 месяцев
- Привлечение большего количества взрослых и воспитанников к сдаче нормативов ГТО
- Повышение имиджа МБУ СШ

Карта текущего состояния процесса (ситуация «как есть»)

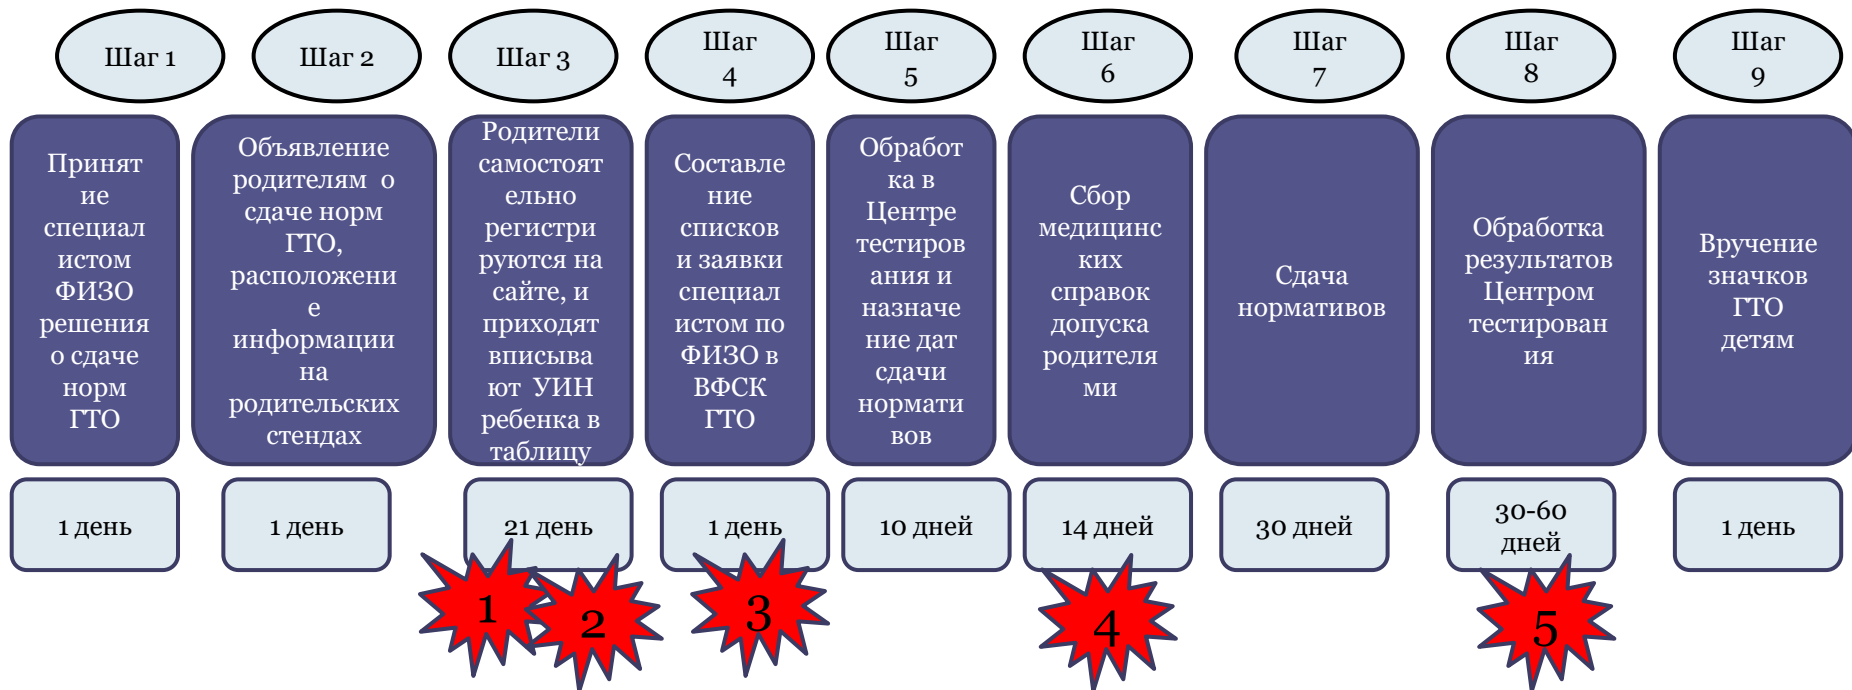


1. Родители долго регистрируются на сайте ГТО, чтобы получить УИН
2. Родители долго собирают информацию в общую заявку для предоставления в Центр тестирования
3. Специалист ФИЗО долго переводит бумажную информацию в электронный вариант
4. Длительность сбора медицинских допусков- справок
5. Длительность времени по приему специалистами Центра тестирования нормативов



ВПП (время протекания процесса) – 120 дней

Пирамида проблем

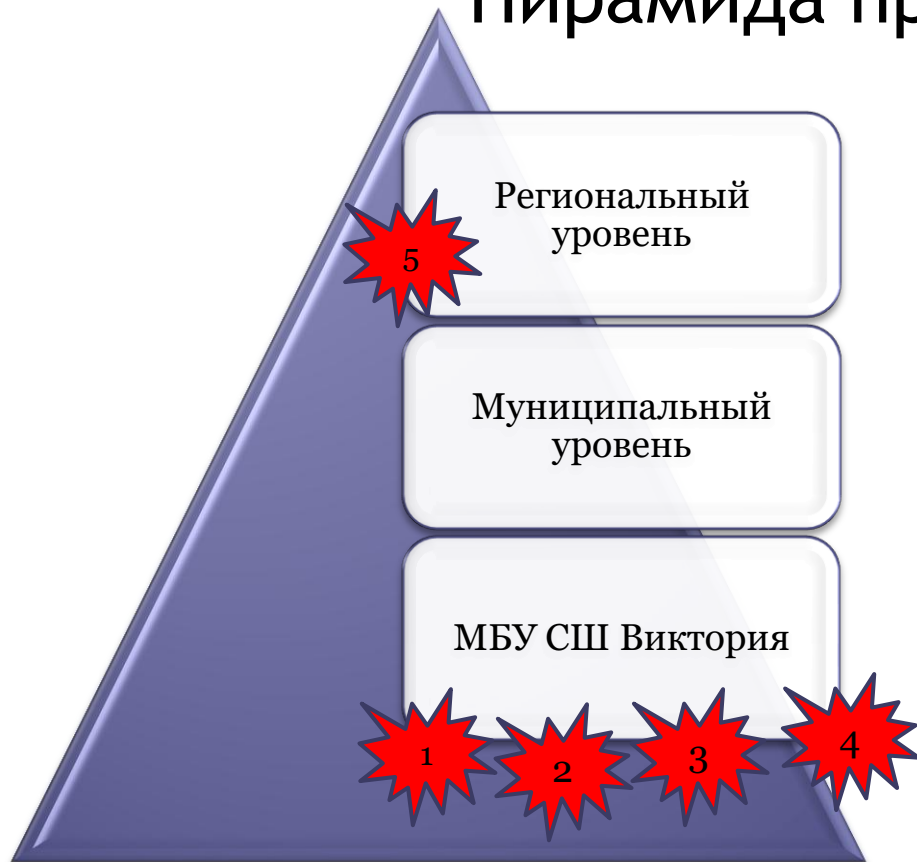

1. Родители долго регистрируются на сайте ГТО, чтобы получить УИН
2. Родители долго собирают информацию В общую заявку для предоставления в Центр тестирования
3. Специалист ФИЗО долго переводит информацию с бумажных носителей в электронный вариант
4. Длительность сбора медицинских допусков – справок
5. Длительность времени по приему специалистами Центра тестирования нормативов

Анализ проблем

Проблема	Способ решения
Длительный по времени процесс сбора УИН участников сдачи нормативов	Использование алгоритма регистрации на сайте ГТО
	Использование мессенджеров (родительских групп) для информирования
	Использование электронных форм сбора информации
Длительность обработки собранной бумажной документации	Использование электронных форм сбора информации
Длительность сбора медицинских справок допусков к сдаче нормативов	Целевой допуск педиатром, закрепленным к спортивной школе
Длительность согласования и продолжительность сдачи нормативов	Специалист по ФИЗО проходит курсы подготовки по приему ГТО и может оказывать помощь специалистам Центра тестирования

Метод «5 почему?»

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Длительность времени по приему специалистами Центра тестирования нормативов

Надо согласовать дату и время приема документов и нормативов командой специалистов ВФСК ГТО

Для увеличения охвата сдачи нормативов специалисты ВФСК ГТО работают командой 2-3 человека


Инструктор ФИЗО может помочь принять нормативы

Инструктор по ФИЗО не имеет право принимать нормативы


Инструктора ФИЗО не обучали подготовки к сдачи

Обучить инструктора ФИЗО на курсах

Карта целевого состояния процесса (ситуация «как будет»)

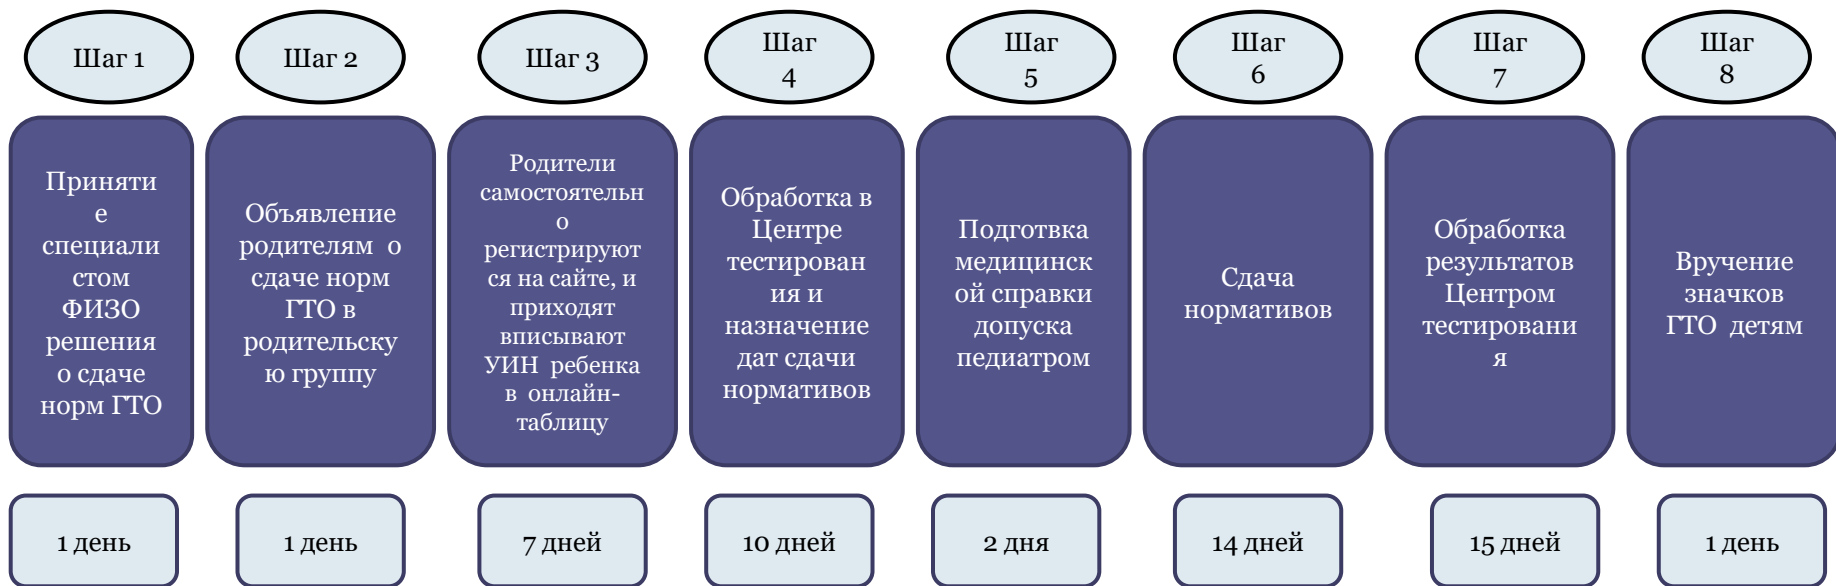


ВПП (время протекания процесса) – 51 день




План мероприятий по устранению проблем


Проблема	Способ решения	Сроки	Исполнение
Использование бумажных форм сбора информации	Использование яндекс- таблиц для сбора информации от родителей	Февраль 2023 года	Работа выполняется
Отсутствие единой формы подачи медицинского допуска	Привлечение мед. работника	Февраль 2023 года	Работа выполняется
Отсутствие алгоритма регистрации на сайте ГТО	Разработка алгоритма действия инструктора при оповещении родителей для регистрации на сайте ГТО	Март 2023 года	Работа выполняется
Небольшое количество участников	Пропагандистские мероприятия: приглашение родителей сопровождать детей во время сдачи нормативов, проведение сдачи на спортивных стадионах, проведение развлечений на тематику ГТО	Апрель 2023 года	Работа выполняется
Длительность согласования с Центром тестирования	Инструктор проходит курсы и имеет допуск к принятию нормативов совместно с Центром тестирования	Май 2023 года	Работа выполняется

Достигнутые результаты

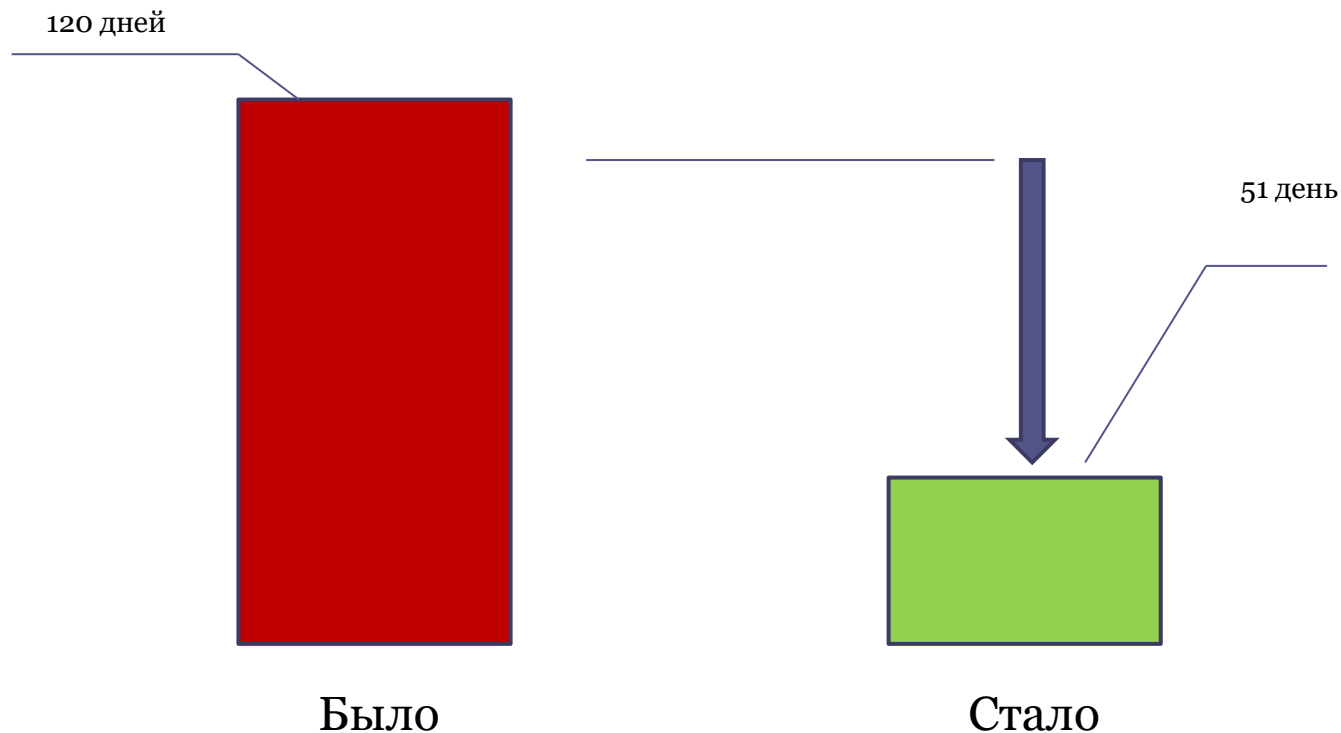

Карта - схема

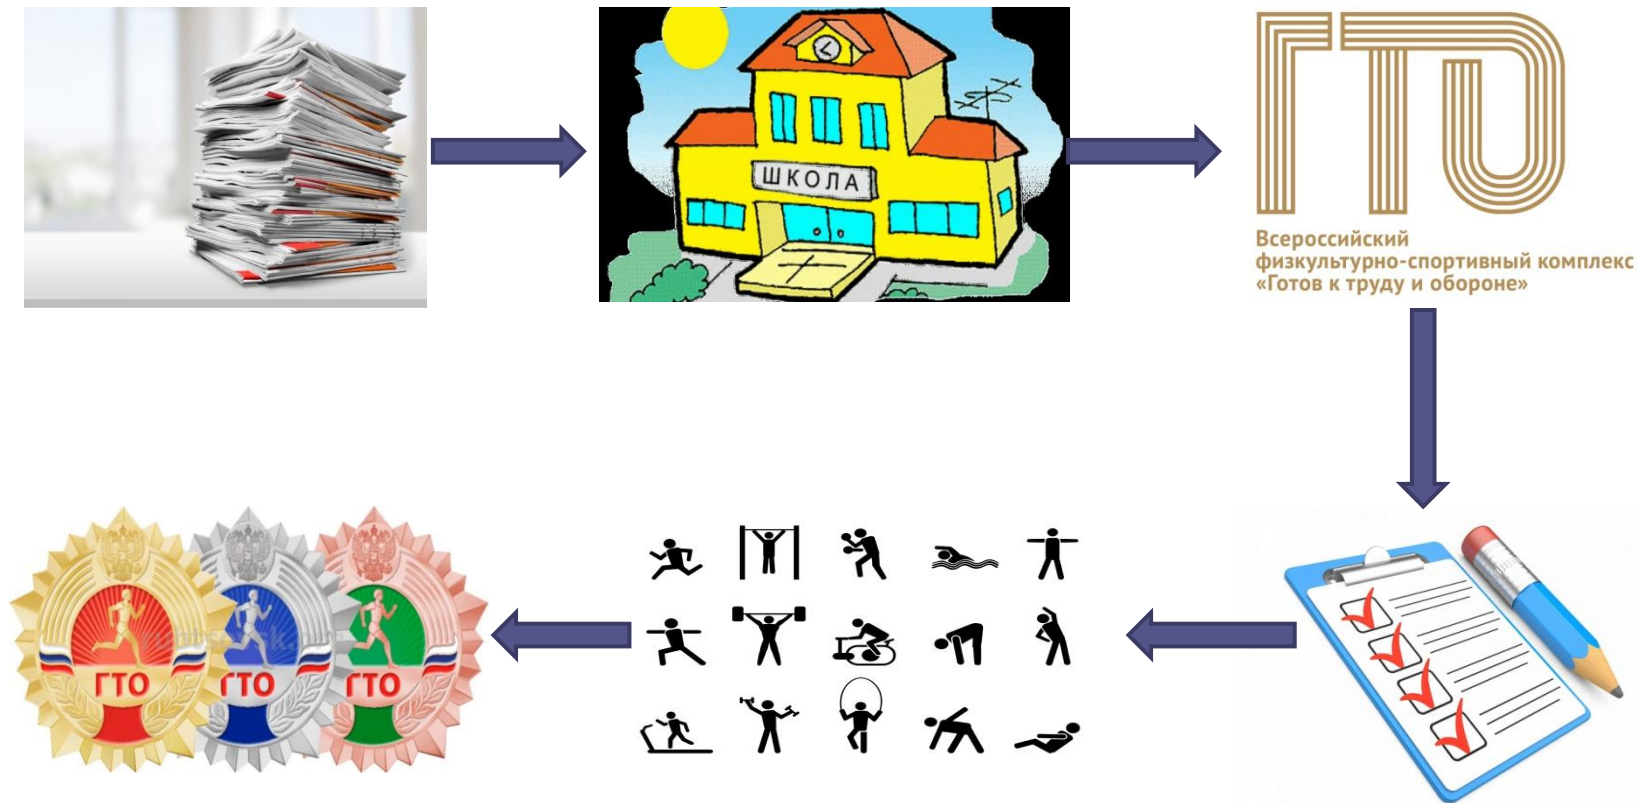

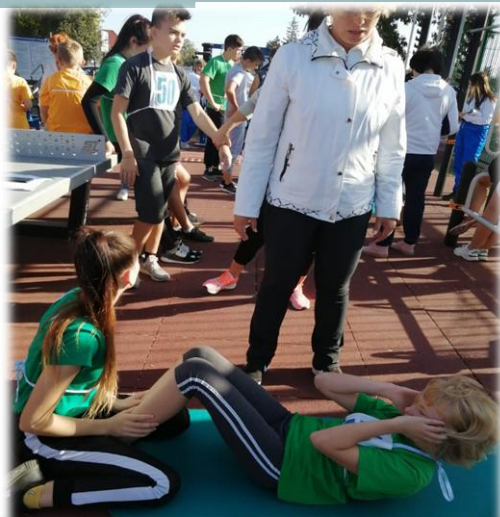



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МБУ СШ «Виктория»

Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Красная, 20

Телефон: 8 861 53 5 52 08

E-mail: diussh.viktoria@mail.ru
